Wilhelm Büchner University of Applied Sciences

Projektarbeit Master

Thema:
Konzeptionieren eines Coasterbots

Endbericht



Team: Coasterbot

Studierender	**Matrikelnummer**
Dennis Borutta, B. Eng	857962
Stefan Etringer, B. Eng	865769
Gereon Such, M. Sc.	867070

Betreuer: Dr.-Ing. Winfried Tiedge

Abgabedatum: 07.11.2026

Versionshistorie

Version	Datum	Bearbeiter	Änderungen
1	03.10.2026	Borutta	Erster Entwurf.
2	08.10.2026	Such	Erstfassung eigener Anteile.
3	10.10.2026	Etringer	Beschreibung der Algorithmik und Simulation.
4	10.10.2026	Etringer	Beschreibung des Ergebnis und des Nutzens.
5	15.10.2026	Borutta	Beschreibung Projektziel und der Mechanik.
6	18.10.2026	Borutta	Beschreibung Zeitplan Soll-Ist, Projektergebnis und Teambildung/Rollenverteilung.
7	20.10.2025	Borutta	Entfernung der Planungsstichpunkte.
8	28.10.2025	Borutta	Weichere Einleitung im Projektziel. Perspektive zur Zusammenarbeit und dem Projektergebnis eingebracht
9	29.10.2025	Such	Abkürzungsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis **4**

1 Projektumsetzung **5**
1.1 Projektziel (Dennis Borutta) 5
1.2 Lösungsweg: Mechanischer Aufbau (Dennis Borutta) 6
1.3 Lösungsweg: Algorithmik und Simulation (Stefan Etringer) 7
1.4 Lösungsweg: Elektronik und Abstraktion (Gereon Such) 10
1.5 Projektergebnis (Dennis Borutta) 14
1.6 Zeitplan Soll/Ist (Dennis Borutta) 15
1.7 Kosten- und Ressourcenplan Soll/Ist (Gereon Such) 15
1.7.1 Personal 16
1.7.2 Material 16
1.8 Nutzen und Weiterentwicklung des Ergebnis (Stefan Etringer) 17

2 Projektablauf **18**
2.1 Teambildung und Rollenverteilung (Dennis Borutta) 18
2.2 Zusammenarbeit im Projekt (Stefan Etringer) 19
2.3 Kommunikation im Projekt (Gereon Such) 20
2.4 Bewertung der Zusammenarbeit 22
2.5 Bewertung des Projektergebnis 23

Abkürzungsverzeichnis

BOM	Bill of Material
DMS	Dokumenten-Management-System
DWA	Dynamic Window Approach
EKF	Extended Kalman Filter
EMV	Elektromagnetische Verträglichkeit
IMU	Inertial Measurement Unit, Inertialsystem
INS	Inertial Navigation System
PCB	Printed Circuit Board
PWM	Puls-Weiten-Modulation
ROS	Robot Operating System
RRT*	Rapidly-exploring Random Tree, Sternvariante
SBC	Single-Board Computer
SLAM	Simultaneous Localization and Mapping
UKF	Unscented Kalman Filter
WBH	Wilhelm-Büchner-Hochschule

1 Projektumsetzung

1.1 Projektziel (Dennis Borutta)

Um in der Gastronomie Mitarbeiter zu entlasten und den Gästen ein besonderes Zahlerlebnis zu bieten, möchte die fiktive Firma „Pay With Fun GmbH“ einen Coasterbot auf dem Markt bringen. Neben einer Bezahlfunktion soll dieser Mobile Roboter, Tische reinigen, Getränkeuntersetzer ausgeben und einsammeln können. Zur Ausarbeitung eines Prototypens wird das fiktive Ingenieurbüro „B · E · Sondere Lösung UG“ engagiert, welches durch Gereon Such, Stefan Etringer und Dennis Borutta vertreten wird. Die zu liefernden Grundfunktionen für den Prototypen umfassen folgendes:

- Navigation auf einem Tischoberfläche
- Ausgabe von Getränkeuntersetzer
- Lokalisierung von Getränkeuntersetzer
- Aufnahme von Getränkeuntersetzer

Zur Umsetzung dieser Grundfunktionen dürfen bereitsbestehende Konzepte zu mobilen Robotern verwendet werden. Innerhalb des Projektes sind weitere Ausbaustufen auszuarbeiten und mit einem Testkonzept zu versehen.

Zu diesem Prototypen sind folgende Liefergegenstände bereitzustellen:

- Eine Aufbauanleitung
- Eine Stückliste (Bill of Material (BOM))
- Die zur Fertigung notwendigen Modelle als stl-Dateien
- Ein Simulationsmodell zur Weiterentwicklung
- Der Sourcecode zum Prototypen

Mit dem Upload dieser Liefergegenstände über das Dokumenten-Management-System (DMS) der Wilhelm-Büchner-Hochschule (WBH) gelten sie als ausgeliefert. Ein physischer Aufbau wird nicht separat geliefert werden.

Nicht als Bestandteil des Projekts gelten:

- Ein Serienfertiges Endprodukt
- Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Betrachtungen
- Intelligentes Schwarmverhalten
- Funktionen außerhalb der Grundfunktionen
- Konzeption einer Vermarktung des Produkts

Damit wird das Projekt als „PA2 - Machbarkeitsprojekt“ im Maßstab der WBH geführt. Der Projekstart erfolgte am 21.07.2026 und das Projektende ist am 07.11.2026 mit der Abgabe dieses Endbericht. Damit beträgt der angesetzte zeitliche Rahmen 3,5 Monate.

1.2 Lösungsweg: Mechanischer Aufbau (Dennis Borutta)

Ausgangslage und Leitlinien

Zur Umsetzung der Mechanik sind folgende Anforderungen aus dem Pflichtenheft als Leitlinien herangezogen:

- (HW-ACT-005..007) Anforderungen an das Getränkeuntersetzerhandling.
- (HW-MEC-001..005) Anforderungen an die mechanische Konstruktion.

Benchmarking und Auswahl der Verfahren

Zur Auswahl der Lösungmethoden wurden unterschiedlichen Lösungsoptionen recherchiert und Gegenüberstellungen. Dies ist ausführlich im Dokument *Alternativenbewertung* beschrieben und im DMS der WBH abgelegt. Daher werden an dieser Stelle lediglich gewählten Lösungswege mit ihren Begründungen verkürzt vorgestellt.

Tabelle 2: Betrachtete Alternativen und gewählte Lösung der Mechanik.

Funktion	**Alternativen**	**Gewählt**	**Begründung**
Chassis - Material	Holz, Metall	Kunststoff (Polylactid)	Kunststoff ist günstig und Polyactid lässt sich besonders einfach auf einem 3D-Drucker verarbeiten.
Chassis - Form	Abgerundet	Rechteckig	Durch die rechteckige Form sind nachträgliche Anpassungen einfach anzubringen und die Konstruktion einfacher.
Chassis - Modularität	Zwischenebenen	Austauschbare Seitenwände	Druck kann in einzelnen Teilen erfolgen und die Wände sind austauschbar (Es muss kein gesamtes neues Gehäuse hergestellt werden).
Untersetzer ablegen	Roboter mit Greifer/Sauger	Ausschieber	Weniger komplex und benötigt weniger Antriebe.
Untersetzer aufnehmen	Roboter mit Greifer/Sauger, Manuelle Einlage	Magnetische Aufnahme	Weniger komplex und benötigt weniger Antriebe.

Anpassungen während der Umsetzung

Während der Testphase haben sich einige Anpassungbedarfe an der Mechanik ergeben. So musste ein Encoder nachgerüstet werden. Zur Befestigung der Lichtschranke des Encoders war ein neuer Motohalter notwendig. Weiterhin hat sich herausgestellt, dass die Mechanik zur Aufnahme und Ausgabe der Untersetzer nicht zuverlässig funktioniert. Durch die Entfernung der Führungselemente und einer breiteren Auflagefläche des Ausschiebers konnte die Zuverlässigkeit verbessert werden.

1.3 Lösungsweg: Algorithmik und Simulation (Stefan Etringer)

Ausgangslage und Leitlinien

Zur Umsetzung der Algorithmik sind folgende Anforderungen aus dem Pflichtenheft als Leitlinien herangezogen:

- (NAV-*) Anforderungen an eine zielgerichtete autonome Bewegung auf der Tischfläche.
- (SAF-*) Anforderungen an eine Sicherheitskomponente mit übergeordneter Priorität, u. a. Hindernis- und Tischkantenerkennung.

Als Hardware wurde bewusst ein einfacher Mikrocontroller (Raspberry Pi Pico 2) gewählt statt eines Single-Board Computer (SBC) mit Robot Operating System (ROS): Ein SBC ist ein vollwertiger Einplatinencomputer mit eigenem Betriebssystem, ROS ein darauf aufbauendes Robotik-Framework, das Navigation, Sensorverarbeitung und Kommunikation zwischen Komponenten bereits fertig mitbringt. Der gewählte Mikrocontroller hat dagegen kein Betriebssystem und muss all diese Aufgaben selbst in einer einzigen Firmware abbilden. Er ist dafür aber deutlich günstiger und für die Anforderungen des Projekts ausreichend. Deshalb wurde entschieden, die Navigation zunächst in einer Physiksimulation (Webots) zu entwerfen und gegen die bereits festgelegten Testfälle aus dem Testkonzept zu verifizieren, bevor sie auf die reale Hardware übertragen wird. Entscheidend dafür ist die Hardwareabstraktionsschicht `RobotHAL` (siehe Abschnitt 1.4): Navigations- und Sicherheitslogik kennen ausschließlich dieses Interface und sollen dadurch unverändert von der Simulation auf die Zielhardware übernommen werden können.

Benchmarking und Auswahl der Verfahren

Grundlage war eine systematische Literaturrecherche (M0, *Algorithmen.md*) zu Graphalgorithmen, heuristischer und dynamischer Pfadplanung, lokaler Kollisionsvermeidung, Lokalisierung sowie Manipulationsplanung. Die daraus abgeleiteten Möglichkeiten und Alternativen wurden in einer Mindmap (M3, *KonzeptMindMap-Algorithmen.svg*) je Teilproblem strukturiert und in der Alternativenbeschreibung (M3) anhand der festgelegten Anforderungen bewertet: begrenzte Tischfläche, begrenzte Rechenleistung sowie

der sicherheitskritischen Anforderung, den Tisch nicht zu verlassen. Tabelle 3 fasst die resultierende Auswahl zusammen.

Tabelle 3: Betrachtete Alternativen und gewählte Lösung der Navigationsalgorithmik.

Funktion	**Alternativen**	**Gewählt**	**Begründung**
Globale Pfadplanung	Dijkstra, Breitensuche	A*	Heuristik lenkt die Suche zielgerichtet, bleibt auf dem Gitter dennoch optimal.
Lokale Kollisionsvermeidung	Potentialfelder, adaptive/neuronale DWA	Dynamic Window Approach	Bezieht Bewegungsdynamik ein, vermeidet lokale Minima der Potentialfeldmethode.
Dynamische Neuplanung	D*, LPA*	D* Lite	Etabliertes, inkrementelles Verfahren für nachträglich entdeckte Hindernisse.
Lokalisierung	IMU/INS allein, voller EKF/UKF, SLAM	Radodometrie + Gyro, Komplementärfilter	Für die bekannte, flache Tischfläche ausreichend, SLAM nicht erforderlich.
Manipulationsplanung	Inverse Kinematik + RRT*	nicht umgesetzt	Laut Abgrenzung nicht Teil der Simulationssoftware in M4.

Von der Recherche zur Simulation

Die gewählten Verfahren wurden als eigenständige C++-Module umgesetzt, die ausschließlich über `RobotHAL` auf die Hardware zugreifen:

- `OccupancyGrid` bildet die Tischfläche als Gitterkarte mit Distanzfeld ab. Bekannte Hindernisse werden direkt eingetragen, live erkannte erst nach mehreren konsistenten Messungen.
- `astarPlan` liefert darauf einen geglätteten Pfad, `DStarLite` plant ihn inkrementell um, sobald der Ultraschallsensor ein unkartiertes Hindernis entdeckt.
- `DwaPlanner` bestimmt daraus jeden Regelzyklus das Geschwindigkeitspaar beider Seiten.
- `PoseEstimator` liefert die Lokalisierung über einen Komplementärfilter aus Radodometrie und Gyroskop, der beim Schlupf des Skid-Steer-Antriebs in Kurven stärker auf das Gyroskop vertraut.
- `SafetyMonitor` und `FaultMonitor` bilden die Sicherheitsebene. Der `SafetyMonitor` reagiert mit übergeordneter Priorität auf Tischkanten, der `FaultMonitor` zusätzlich auf Sensor- und Aktorausfälle.

Dedizierte Betriebsarten erlaubten es, jede Stufe einzeln und reproduzierbar zu prüfen, bevor sie Teil des Gesamtsystems wurde.

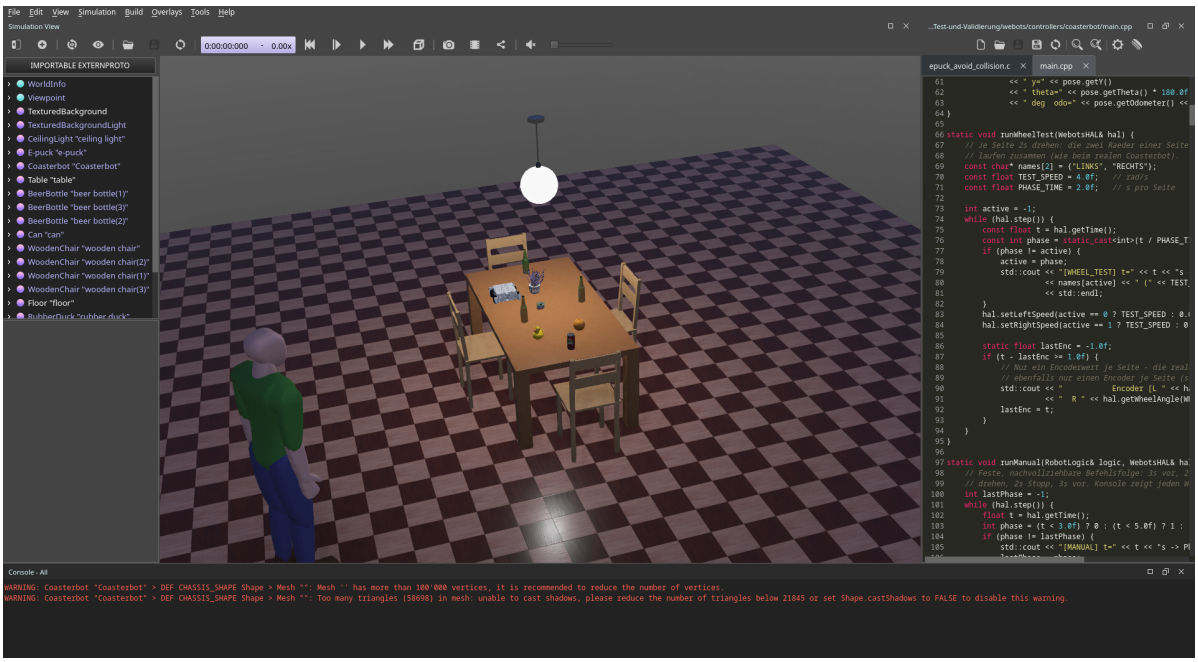


Abbildung 1: Webots-Simulationsumgebung des Coasterbot-Projekts.

Anpassungen während der Umsetzung

Mehrere Entscheidungen wurden angepasst, nachdem sich in der Simulation Probleme verdichteten. Der volle Sensorfusions-Ansatz (EKF/UKF) wurde zugunsten des einfacheren Komplementärfilters zurückgestellt. Dies ist für die bekannte Tischfläche ausreichend genau, allerdings ohne Unsicherheitsschätzung der Pose. Da die lokale Bewegungssteuerung dem kürzesten Pfad von A* nahe von Ecken nicht zuverlässig folgen konnte, wurden zwei unterschiedlich stark inflatierte Gitter (Planung/Kollisionsvermeidung) sowie eine Pfadglättung eingesetzt. Diese Pfadplanun verschiebt Wegpunkte von Ecken weiter zur Mitte. Eine einzelne Costmap, deren Hindernis-Kosten mit der Entfernung graduell statt abrupt ansteigen, würde die beiden getrennten Gitter künftig überflüssig machen. Der `FaultMonitor` war in der ursprünglichen Mindmap noch nicht vorgesehen und kam erst hinzu, als sich die Testfälle zu Sensor- und Aktorausfällen konkretisiert haben. Bei seiner eigenen Verifikation fiel dabei eine zu eng gewählte Plausibilitätsschwelle auf, die normales Sensorrauschen fälschlich als Ausfall wertete. Dies wurde korrigiert. Bewusst nicht umgesetzt blieben die Manipulationsplanung sowie die missionsweite Ablaufsteuerung (`IDLE` $\rightarrow$ … $\rightarrow$ `DONE`), für die inzwischen ein mit der Elektronik abgestimmter Vorschlag existiert.

In der simulierten Verifikation bestanden alle bearbeiteten Testfälle: Zielfehler rund 5.8 cm, Hindernisabstand mindestens 0.22 m, zuverlässige Tischkantenerkennung, byte-identische Wiederholläufe sowie Sensor-/Aktorfehlererkennung innerhalb von 0.02 s bzw. 0.34 s. Offen bleiben nur die ohnehin nicht im Scope liegenden Testfälle zum Untersetzerhandling sowie der Abgleich gegen den realen Prototyp.

1.4 Lösungsweg: Elektronik und Abstraktion (Gereon Such)

Ausgangslage und Leitlinien

Die im Pflichtenheft definierten Hardwarefunktionen mussten durch entsprechende Sensorik, Aktorik und Rechenleistung abgedeckt werden:

- `HW-CPU-001..004` Rechenleistung für Sensordatenverarbeitung und Navigation
- `HW-SEN-001..005` Hindernis und Tischkantenerkennung
- `HW-SEN-006/007` Positionierung und Orientierung
- `HW-ACT-001..004` Bewegungssteuerung
- `HW-ACT-005..007` Untersetzeraufnahme und -ausgabe
- `HW-PWR-*` Energieversorgung

Ein weiteres Kriterium bei der Komponentenauswahl war schnelle und problemlose Verfügbarkeit in geringen Stückzahlen sowie ein geringer Preis. Da eine Printed Circuit Board (PCB) Fertigung inklusive Versand einen enormen Zeitaufwand impliziert, z.B. JLCPCB ca. 4 Wochen, wurden alle Komponenten als Development-Boards beschafft und diese auf Lochrasterplatine sowie mit Steckverbindern auf Pinheadern verbunden. Jede Komponente wurde iterativ in Betrieb genommen und die Funktionalität sowie Eignung einzeln verifiziert. Dabei ergeben sich in einzelnen Fällen Schwierigkeiten, die Anpassungen erforderten, dies soll im Anschluss an die ursprüngliche Auswahl der Komponenten erläutert werden.

Benchmarking und Auswahl der Komponenten

Die Auswahl der Komponenten wurde in Phase M3 (Alternativenbeschreibung) diskutiert, hier wurden für jede Anforderung Lösungsvarianten identifziert und eine ausgewählt. Tabelle 4 fasst die wesentlichen Entscheidungen zusammen.

Tabelle 4: Betrachtete Alternativen und gewählte Lösung der Elektronik.

Funktion	**Alternativen**	**Gewählt**	**Begründung**
Controller	Arduino Uno, ESP32, Raspberry Pi Pico2	Raspberry Pi Pico 2 (RP2350)	Uno nicht performant genug. Pico2 nimmt weniger Leistung auf als ESP32 und hat mit PIO Interface Möglichkeit zeitkritische Signale zu generieren.
Hindernis-erkennung	Ultraschall HC-SR04, Kamera OV7670, Bumper, IR-Sensor	HC-SR04 in Fahrtrichtung	Unfälle auf dem Tisch sind zu wahrscheinlich mit Bumper Sensor. HC-SR04 bietet einfache und günstige Distanzmessung ohne Bildverarbeitung. Die Kamera wurde wegen des Verarbeitungsaufwands auf dem Mikrocontroller zurückgestellt.
Tischkanten-erkennung	IR-Reflexsensor, Kamera	4 IR-Sensormodule (je Ecke)	Kamera zurückgestellt, daher alternativlos.
Lage und Odometrie	IMU, Radencoder, Kamera	MPU-6050 (I^2C) und LM393-Gabellichtschranken	Die IMU (Inertialsystem) liefert die Drehung, die Encoder die gefahrene Strecke. Die Radencoder wurden während der Testphase ergänzt (siehe unten).
Untersetzer-mechanik	Micro-Servo, Schrittmotor	2 Micro-Servos (MG90)	Positionsgeregelt, nur ein Signalpin, aufgrund hohen Widerstands des PETG Aufbaus mussten Metallgewinde gewählt werden.
Antrieb	TT-Motoren mit H-Brücke	4 TT-Motoren (1:48), 2× TB6612FNG	Günstig und als Set mit Rädern verfügbar. Der Regler TB6612FNG wurde aufgrund geringerer Verlustleistung als der L298N gewählt.
Energie-versorgung	9-V-Block mit Linearregler 78x05; Li-Ion-Akku mit DC/DC-Wandler	18650-Li-Ion-Akku (3.7 V) mit Step-Up-Wandler auf 5 V	Die gewählten Motoren bedürfen recht hoher Ströme, dieser kann nicht durck Linearregler geliefert werden. Folglich Motorspannung `VM` direkt am Akku, Steuerspannung `VCC` über Step-Up-Wandler.
Bedienung und Status	RGB-LED oder diskrete LEDs; Taster	RGB-LED, Taster, Hauptschalter	Eine RGB-LED kann alle Betriebszustände über Farbe und Blinkmuster darstellen.

Elektrischer Aufbau

Die Schaltung wurde in der Open Source Software KiCad erstellt (Abbildung 2) und mit der Software DIYLC auf ein Lochrasterplatinenlayout im Raster 30×24 übertragen. Externe Komponenten werden über Pin Header angeschlossen. Die Platine trägt den Mikrocontroller, den Step-Up-Wandler, die Motortreiber, das Inertialsystem, die RGB-LED, Glättungskondensatoren für die Versorgungsspannungen sowie Pulldown Widerstand und Endprellung für den Taster. Der Aufbau ist in der Aufbauanleitung (M4) detailliert dokumentiert.

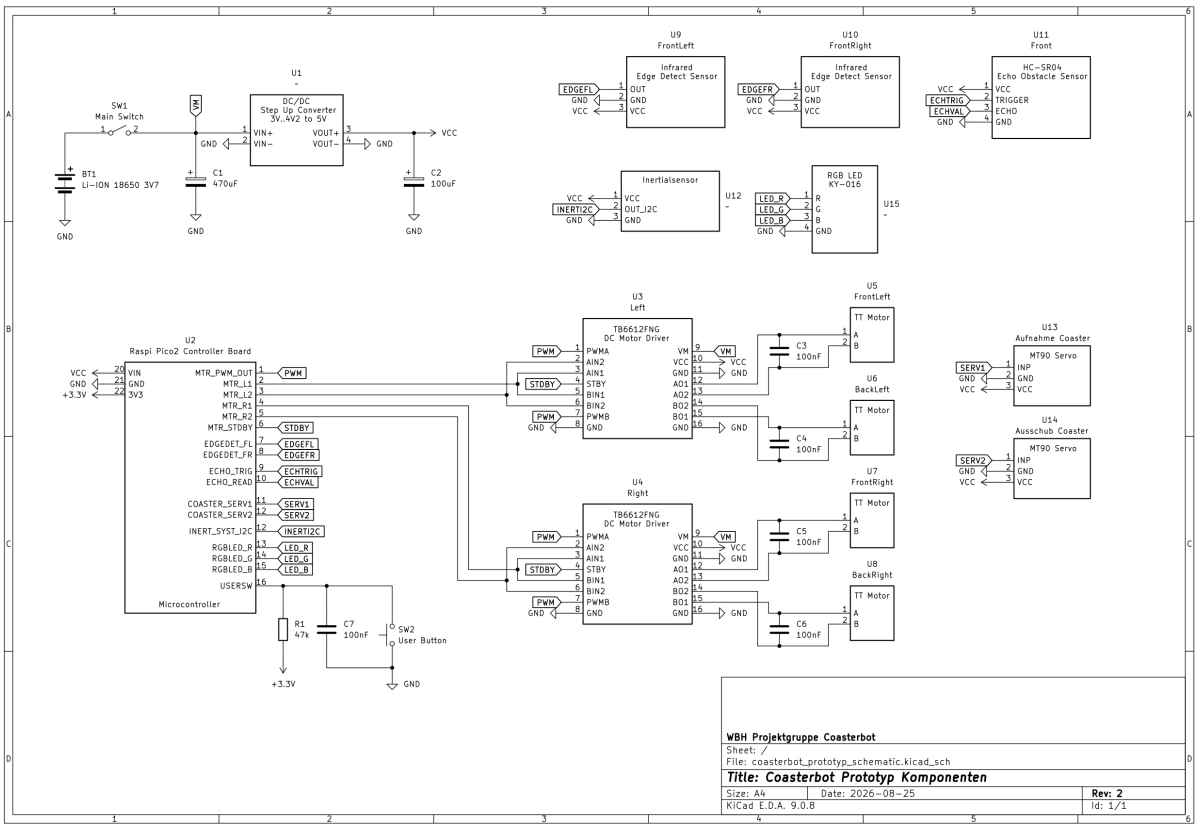


Abbildung 2: Gesamtschaltung der Elektronik (aus der Aufbauanleitung).

Beide Motoren einer Seite sind durch je einen Motortreiber geregelt, wobei sich beide Motortreiber das Standby- sowie PWM-Signal teilen. Dadurch drehen alle Motoren stets betragsmäßig gleich schnell. In der Folge sind nur Geradeausfahrt vorwärts/rückwärts als auch bei entgegengesetzter Drehrichtung Kurven auf der Stelle möglich. Diese Vereinfachung kann für eine zukünftige Ausbaustufe eventuell überdacht werden, da die Positionserkennung durch Odometrie(Zählen der Rad-Rotationen) bei Rotation auf der Stelle verhätnismßig ungenau ausfällt. Dies ergab sich in den Inbetriebnahmetests und wurde durch das Intertialsystem kompensiert.

Hardwareabstraktion

Die zentrale Schnittstelle ist die abstrakte C++-Klasse `RobotHAL`, die in der Simulation parallel zur Entwicklung der Elektronik definiert wurde. Sie beschreibt die Fähigkeiteiten des Roboters(Geschwindigkeit je Seite, Objektdistanz nach vorne, Kantensensor, Drehrate, Encoderwinkel, Zeit, Servosteuerung und LED), und referenziert weder die Webots Implementierung noch die eigentlichen Hardwareimplementierungen. Diese abstrakte Basisklasse wird dann in der `HardwareImplementationHAL` implementiert und bindet dann die Controller der einzelnen Komponenten ein. Diese Controller sind im Projekt

Source Code als Template Klassen für die Hardwareparameter auf dem Arduino Framework implementiert. In der Hardwareabstraktion werden dann alle Controller mit den entsprechenden Pins aus einer Projektkonfigurationsdatei instanziiert und kombiniert.

Alle Komponenten sind *non-blocking* implementiert. Wenn z.B. die Motorsteuerung einer Seite sich derzeit in Vorwärtsdrehung befindet, dann durch die Steuerung aber ein Richtungswechsel ausgelöst wird, so muss zunächst aktiv abgebremst werden und erst wenn dieser Bremsvorgang beendet ist darf der Motor wieder in Rückwärtsrichtung angesteuert werden. Solche zeitabhängigen Vorgänge können natürlich durch `delay`/`sleep`-Befehle gelöst werden, in dieser Zeit erfolgt aber auch keine Sensorauswertung oder weitere Parametrierungen. Der Non-blocking Ansatz implementiert in den Komponenten jeweils eine interne Statemachine, die nach variablen Zeitintervallen einen Zustandsübergang durchführt und die Ausgangssignale anpasst oder nur in fixen Zeitintervallen Sensorwerte wiederum ausliest. Alle Aktionen finden in der Anwendungslogik weiterhin seriell statt, aber in geplanten Intervallen in `step` oder `update` Methoden, die in jedem Hauptschleifenzyklus durchlaufen werden und meistens direkt zurückspringen (Early Exit).

Anpassungen während der Umsetzung

Der ursprüngliche Ansatz für das Positionierungssystem war eine Integration des Beschleunigungssensors um einen Geschwindigkeitswert zu erhalten, Da die TT Motoren eine solche Information schlicht nicht bereitstellen können. Dieser Geschwindigkeitswert sollte wiederum integriert werden um eine absolute Positionierung zu erhalten.

Während der Hardwaretests zeigte sich, dass trotz Bias-Kalibrierung, Lagekorrektur und Stillstandserkennung in Verbindung mit der Motorsteuerung die erreichbare Genauigkeit für ein Positionssystem außerhalb akzeptabler Toleranz lag: Durch Testfahrten immer wieder vorwärts und rückwärts summierte sich ein Fehler auf die aktuelle Position von einigen Dezimetern mit steigender Tendenz. In der Folge wurde die Motorhalterung modifiziert und an der dem Rad abgewandten Seite zweier TT Motoren eine Gabellichtschranke mit 20-Loch Drehscheibe und LM393 Komparator angebracht. Durch diese Kodierung ist die Änderung des Radwinkels mit $1/40$ des Umfangs bestimmbar, bei Raddurchmesser von 66 Millimeter ergibt sich bei einem *Tick* am Sensor(Wert-Wechsel) eine Fahrtstrecke von $66 \times \pi/40 = 5.2$ Millimeter. Dies ist für eine gemessene Strecke zwar noch akzeptabel, aber bei Rotation wiederum zu ungenau um einen echten Drehwinkel für ein Navigationssystem zu bestimmen, weshalb der Drehwinkel weiterhin durch das IMU-System bezogen wird, wo Rotationswinkel weniger fehlerbehaftet sind als lineare Beschleunigungen. Bei der Implementierung der Tick-Erkennung wurde zusätzlich noch mit einem Hardwareinterrupt gearbeitet und konsekutive Ticks aufsummiert um sicherzustellen, dass nicht durch zu geringe Hauptschleifenfrequenz Ticks verloren gehen. Zudem wurden beide dieser Odometriecontroller mit der Motorsteuerung gekoppelt, sodass die Drehrichtung des jeweiligen Rades berücksichtigt wurde.

Weitergehend wurde festgestellt, dass eine Drehbewegung auf der Stelle ein deutlich höheres Drehmoment im Gegensatz zu Geradeausfahrt bedarf. Dies wurde in der Motorsteuerung berücksichtigt, allerdings ist der Schlupf der Räder auf einer Tischoberfläche hier sehr hoch. Vermutlich ist also in der Folge eine Navigation mit *sanften Kurven* doch zweckmäßiger. Dies sollte für eine weitere Ausbaustufe wie bereits erwähnt in Betracht gezogen werden.

Derzeit noch nicht umgesetzt sind die Akkuüberwachung (`HW-PWR-002/003`) sowie eine Rückkopplung von Odometriesystem zu Motorsteuerung um eine tatsächliche Geschwindigkeitsregelung auf $\frac{m}{s}$ zu erreichen. Die Ansteuerung der Motoren erfolgt über das Puls-Weiten-Modulation (PWM) Signal, das lediglich von 0 für minimalem bis 255 für maximales Drehmoment parametriert werden kann, die tatsächliche Drehgeschwindigkeit ist aber dann wiederum von der Motorspannung `VM` abhängig.

1.5 Projektergebnis (Dennis Borutta)

Das Projektergebnis umfasst eine lauffähige Simulation und einen Prototyp. Zum Projekt stehen alle relevanten Informationen und die im Projektziel geforderten Dokumente im DMS der WBH bereit. Die Abbildung 3 zeigt von links nach rechts die Vision, das Simualtionsergebnis und den Prototyp.

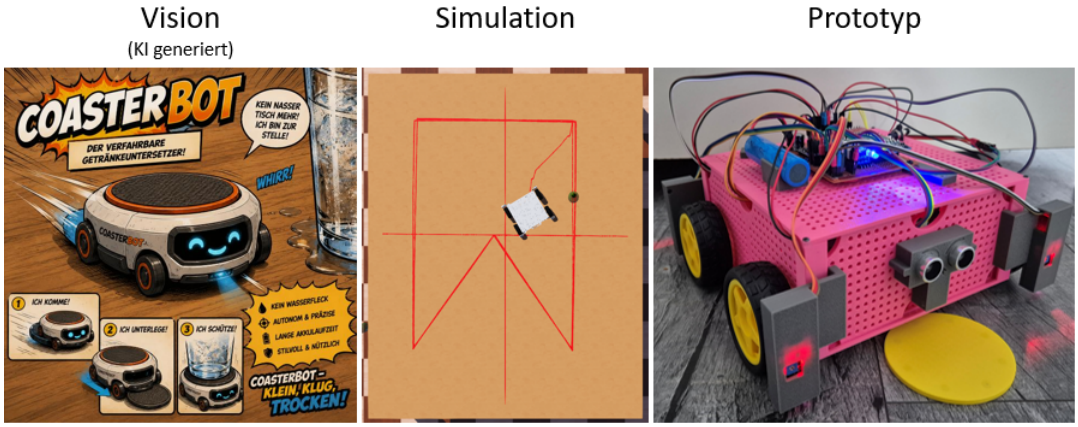


Abbildung 3: Projektergebnis: Vision, Simulationsergebnis und Prototyp

Damit hat das Projekt die Projektziele erreicht. Der Funktionsumfang ist jedoch kritisch zu betrachten. Insbesondere die Navigation und der Coastermechanismus müssen verbessert werden, um Untersetzer genauer anzufahren und zu positionieren. Weiterhin gibt es bisher noch keine Kontrollmechanismen, um die Anzahl der Untersetzer im Speicher zu überwachen oder eine Anwesendheit eines Untersetzer zu kontrollieren. Damit umfasst der Prototyp lediglich Grundfunktionen, in dem er sich selbstständig bewegen, Untersetzer aufnehmen, Untersetzer ablegen und Kollisionen und Stürze vermeiden kann.

1.6 Zeitplan Soll/Ist (Dennis Borutta)

Über das eingesetzte Projektplanungstool Notion wurden die Abweichungen zwischen Soll und Ist Terminen erfasst und die Abweichungen berechnet. Das Ergebnis ist in Abbildung 4 dargestellt.

# ID	Aa Name	Phase	Kategorie	Soll Start	Soll Ende	Ist Start	Ist Ende	Σ Dif(Start)	Σ Dif(End)
100	P0 Studien- und Planungsphase 4	P0	Phase	Jul 15	Jul 29	Jul 15	Jul 31	0	2
1000	Grundlagen schaffe	P0	Teilaufgabe	Jul 15	Jul 24	Jul 15	Jul 31	0	7
101	Dokumente zusammentragen	P0	Teilaufgabe	Jul 23	Jul 26	Jul 23	Jul 26	0	0
102	M0 Meilensteingespräch	P0	Meilenstein	Jul 27	Jul 29	Jul 27	Jul 29	0	0
200	P3 Entwicklung 1	P3	Phase	Jul 29	Sep 6	Jul 29	Sep 6	0	0
2000	Anforderungsaufnahme durchführen	P3	Teilaufgabe	Jul 29	Aug 13	Jul 31	Aug 19	2	6
3000	Konzeption ausarbeiten	P3	Teilaufgabe	Aug 15	Sep 4	Aug 3	Sep 4	-12	0
201	Dokumente zusammentragen	P3	Teilaufgabe	Aug 28	Sep 1	Aug 28	Sep 1	0	0
202	M3 Meilensteingespräch	P3	Meilenstein	Sep 1	Sep 3	Sep 1	Sep 3	0	0
300	4 Validierung/Prototyp	P4	Phase	Sep 5	Oct 27	Sep 5	Oct 27	0	0
4000	Prototyp erstellen	P4	Teilaufgabe	Sep 5	Oct 1	Aug 30	Oct 14	-6	13
5000	Test durchführen	P4	Teilaufgabe	Oct 2	Oct 11	Sep 25	Oct 15	-7	4
6000	Maturity Level feststellen	P4	Teilaufgabe	Oct 11	Oct 17	Sep 27	Oct 17	-14	0
301	Dokumente zusammentragen	P4	Teilaufgabe	Oct 18	Oct 22	Oct 19	Oct 24	1	2
302	M4 Meilensteingespräch	P4	Meilenstein	Oct 25	Oct 27	Oct 25	Oct 28	0	1
400	Endbericht	P99_Abschluss	Phase	Oct 30	Nov 5	Oct 3		-27	0
500	Projektpräsentation	P99_Abschluss	Phase	Nov 18	Nov 18			0	0

Abbildung 4: Soll/Ist-Zeitplan

Aus der Abbildung 4 ist erkennbar, dass es Abweichungen gab, diese jedoch kompensiert wurden. Auffällig sind negative Abweichungen. Diese sind entstanden, da nicht alle Projektmitglieder an denselben Themen zur selben Zeit arbeiten konnten. Daher wurden in Abstimmung bereits einzelne Dokumentenstrukturen und Vorlagen für zum Beispiel Testläufe vorzeitig erstellt. Die größte Verzögerung ist bei der Teilaufgabe „Prototyp erstellen“ zu sehen. Diese ist mit bereits erwähnten Nachbesserungsbedarfen begründet. Entsprechend später konnten die Testdurchläufe durchgeführt werden. Die nächstgrößeren Verzögerungen sind bei der Teilaufgabe „Grundlage schaffen“ und „Anforderungsaufnahme durchführen“ zu sehen. Diese sind entstanden, da der erste Meilenstein M0 nur unter Auflagen bestanden wurde. Diese Auflagen wurden priorisiert bearbeitet.

1.7 Kosten- und Ressourcenplan Soll/Ist (Gereon Such)

Im Kostenplan aus M0 wurde die Arbeitszeit wie in einem Unternehmen mit einem Selbstkostensatz von 89€/h angesetzt. Werkzeuge wurden als gegeben vorausgesetzt, Software sollte ausschließlich Open Source verwendet werden. Dies konnte so gehalten werden.

1.7.1 Personal

Für das Projekt waren 580 Personenstunden (ca. 15 h pro Woche pro Person auf Projektlaufzeit) was wiederum $580 \times 89€ = 51620€$ geplant. In der Planungsphase wurde diese Wochenstundenzahl unterschritten, durch die notwendigen nachträglichen Änderungen bei der Identifizierung der Probleme mit dem Positionierungssystems wurde die Wochenstundenzahl überschritten. Aus Teambewertung ist dies für ein exploratives Projekt aber akzeptabel, da das konkrete Problem kaum voraussehbar war und sich während der Implementierung ergab.

1.7.2 Material

Die Ist-Kosten der Komponenten wurden aus den tatsächlichen Kleinpackungspreisen im Einzelhandel berechnet und sind Netto Beträge. Tabelle 5 listet die Komponenten nach Packungspreis, Stückzahl und resultierendem Projektpreis.

Tabelle 5: Ist-Kosten der Elektronik je Prototyp, berechnet aus den Packungspreisen.

Komponente	**Packungspreis**	**Packung [Stk.]**	**verbaut [Stk.]**	**Anteil**
Raspberry Pi Pico 2	13,69€	1	1	13,69€
TT-Motor mit Rad	12,99€	4	4	12,99€
Radencoder LM393	7,79€	5	2	3,12€
Motortreiber TB6612FNG	7,06€	2	2	7,06€
Micro-Servo	17,13€	10	2	3,43€
Li-Ion-Akku 18650	12,99€	4	1	3,25€
Inertialsensor MPU-6050	8,99€	3	1	3,00€
Verbinder	8,49€	120	30	2,12€
Ultraschallsensor HC-SR04	11,99€	8	1	1,50€
IR-Sensor Tischkante	9,59€	10	4	3,84€
RGB-LED	3,89€	5	1	0,78€
DC/DC-Wandler	5,96€	10	1	0,60€
Taster	4,99€	10	1	0,50€
Pfostenleiste	6,99€	50	2	0,28€
Motor-Kondensatoren 100 nF	9,99€	300	4	0,13€
Hauptschalter	9,59€	80	1	0,12€
Elkos	6,99€	145	2	0,10€
Summe Elektronik	**159,11€**			**56,49€**

Die angesetzten Kosten für das 3D-Druck Filament von 15 €können für den Druck nicht korrekt nachvollzogen werden, sind aber weiterhin ein realistischer Wert. Im Kostenplan aus M0 wurden Materialkosten von insgesamt $40 + 90 + 15 + 20 = 165€$ für Komponenten und Montage sowie 15 € für Filament angesetzt. In Tabelle 6 werden diese Werte gegen die tatsächlichen Werte ohne den in M0 angenommenen Risikopuffer verglichen werden. Die niedrigeren Materialkosten konnten durch kostengünstige Komponenten

sowie Verzicht auf Kamera und eigene PCB Leiterplatte stark reduziert werden, ebenso wie durch den Bezug von Mehrfachverpackungen und Aufteilung der Komponenten in der Projektgruppe.

Tabelle 6: Projektkosten Soll/Ist je Prototyp.

Kostenart	**Soll**	**Ist**
Elektronik (Tabelle 5)	165 €	56,49 €
3D-Druck und Kleinteile	15 €	ca. 15 €
Material gesamt	**207 €**	**ca. 72 €**
Personal	51.620 €	51.620 €
Software und Werkzeuge	0 €	0 €
Gesamt	**ca. 51.827 €**	**ca. 51.692 €**

1.8 Nutzen und Weiterentwicklung des Ergebnis (Stefan Etringer)

Erreichter Stand

Der in Abschnitt 1.3 beschriebene Navigationsaufbau (A*, D* Lite, DWA, PoseEstimator) ist in der Simulation funktional vollständig und gegen die Testfälle `ST-SIM-001` bis `ST-SIM-006` verifiziert, ebenso die darüberliegende Sicherheitsebene (`SafetyMonitor`, `FaultMonitor`). Parallel dazu wurde die in der Softwaredokumentation zunächst nur als Vorschlag skizzierte Missionsablaufsteuerung (Tisch einlernen, Untersetzer ausgeben/einsammeln, Not-Halt) in einem eigenen Simulationsstand (`coasterbot_V_01_00`) umgesetzt und erreicht dort inklusive Hindernisumfahrung eine Positioniergenauigkeit von rund 1.5 cm. Auf der realen Hardware läuft bereits ein eigenständiger, direkt gegen die reale HAL arbeitender Punkt-zu-Punkt-Navigator (`Navigation`), der die Skid-Steer-Einschränkung (nur Geradeausfahrt und Drehung auf der Stelle, siehe Abschnitt 1.4) berücksichtigt. Eine direkte Übernahme des simulierten A*/D*-Lite/DWA-Stapels auf den ressourcenbeschränkten Pico 2 steht noch aus.

Nutzen und Weiterentwicklung

Bevor die algorithmischen Entscheidungen auf der realen Hardware ausgeführt wurden, konnten diese simulationsgestützt verifiziert werden. Dies ist sichtbar am Beispiel der Odometrie: Die erste reale Iteration der Firmware verzichtete, wie ursprünglich geplant, auf Radencoder und integrierte die Position allein aus dem Beschleunigungssensor. Im Hardwaretest erwies sich die so erreichbare Genauigkeit als unzureichend (akkumulierter Fehler im Dezimeterbereich). Da der in der Simulation bereits erprobte `PoseEstimator` (Komplementärfilter aus Radodometrie und Gyroskop, verifiziert auf wenige Zentimeter bis Millimeter Abweichung bei Geradeausfahrt) zeigte, dass eine encoderbasierte Lösung

zuverlässig funktioniert. Deshalb wurden nachträglich Gabellichtschranken an zwei Motoren ergänzt (siehe Abschnitt 1.4). Hierbei hat ein simulationsinterner Ansatz direkt eine Hardwareänderung begründet.

Den physischen Rahmen dafür liefern die Ergebnisse der Elektronik- und Mechanikentwicklung (Abschnitte 1.2 und 1.4): Ohne die aufgebaute Elektronik (Recheneinheit, Motortreiber, Sensorik und Energieversorgung) als reale Plattform zur Verifikation, wären die nötigen Änderungen an der Odometrie, Navigation oder Fehlererkennung nicht sichtbar geworden. Besonderen Nutzen für die Weiterentwicklung bringt dabei die eigens konstruierte Untersetzer-Ausgabe-/Aufnahmemechanik: Statt eines der generisch betrachteten Prinzipien (Sauger, Greifer, manuelle Einlage) wurde eine kombinierte Lösung aus magnetbestückter Hubscheibe und Schubkurbeltrieb entwickelt, ergänzt um einen 90°-indexiert drehenden Ausschieber, der den Untersetzer beim Ablegen ausgerichtet auf einen Führungssteg schiebt und beim Aufnehmen den Weg für den Heber freigibt. Diese Mechanik wird über einen einzigen Servomotor angesteuert und besitzt damit bewusst nur einen Freiheitsgrad. Deshalb genügt zur Steuerung eine einfache servogesteuerte Ablaufprozedur, und der in der Alternativenbeschreibung noch mit inverser Kinematik und RRT* skizzierte, deutlich aufwendigere Ansatz (Abschnitt 1.3) war für die gewählte mechanische Lösung nie erforderlich.

Bei der Missionsablaufsteuerung bildet die Simulation inzwischen nicht mehr jeden Aspekt ab, der bereits Teil der realen Software ist: Im hier dokumentierten Hauptsimulationsstand existiert sie nur als Vorschlag, während sie im parallelen Stand `coasterbot_V_01_00` sowie in der Firmware bereits aktiv weiterentwickelt wird.

Für die Weiterentwicklung des Projekts ergeben sich nach Möglichkeit daraus folgende nächste Schritte: die Zusammenführung der beiden Simulationsstände zu einem gemeinsamen Navigations- und Missionsmodell, sowie die schrittweise Übertragung des verifizierten Navigationssaufbaus auf die reale Firmware Zunächst kann der bereits erfolgreich erprobte `PoseEstimator`-Ansatz, danach die D*-Lite-/DWA-basierte Hindernisvermeidung, eingesetzt werden insofern ausreichend Rechenzeit auf dem Pico 2 zur Verfügung steht.

2 Projektablauf

2.1 Teambildung und Rollenverteilung (Dennis Borutta)

Teambildung

Die Teambildung für das Projekt erfolgte im Rahmen der Veranstaltung „PRJRMa-Projektstart“ an der WBH. In dieser Veranstaltung wurden diverse Projektideen von verschiedenen Studierenden vorgestellt. Eine dieser Projektideen war die Entwicklung des Coasterbots, welche von Dennis Borutta vorgestellt wurde und zu der es noch kein Team gab. Zur Bearbeitung des Projekts haben sich im Rahmen der Veranstaltung die

Studierenden Stefan Etringer und Gereon Such freiwillig bereit erklärt. Damit bestand das Projektteam aus Dennis Borutta, Stefen Etringer und Gereon Such.

Rollenverteilung

Prinzipiell besitzen alle Teammitglieder die Rolle Projektmitarbeiter. Zusätzlich zu dieser Rolle sind noch die Rollen der Projektleitung und des Projektadministators zu besetzen. Die Rolle des Projekleiters hat Dennis Borutta übernommen und führte damit die Meilensteingespräche mit der Projektbetreuung/dem fiktiven Kunden. Die Rolle des Projektadministrators wurde von Stefan Etringer ausgefüllt und pflegte damit die Dokumentenablage im DMS der WBH.

Neben diesen Formalen Rollen haben sich die Projektmitglieder thematisch aufgeteilt. So hatte sich Dennis Borutta um die mechanische Konstruktion und den 3D-Druck, Stefan Etringer um die Algorithmik und Simulation und Gereon Such um die Sensorauswahl und Elektronik gekümmert.

2.2 Zusammenarbeit im Projekt (Stefan Etringer)

Organisatorischer Rahmen

Das Projekt ist in die Meilensteine M0, M3, M4 und M5 gegliedert (Recherche, Produktentwicklung, Umsetzung, Test und Validierung, Endbericht), denen im Repository je ein eigenes Verzeichnis entspricht. Innerhalb des zeitlichen Rahmens wurde die Arbeit unter den drei Teammitgliedern nach technischen Gewerken aufgeteilt: Dennis Borutta verantwortete den mechanischen Aufbau, Gereon Such die Elektronik und die Hardwareabstraktion, Stefan Etringer die Navigationsalgorithmik und deren Simulation. Diese Aufteilung blieb über die Meilensteine hinweg weitestgehend gleicht. Die Zuordnung einzelner Arbeitspakete und Termine erfolgte über Notion (siehe Abschnitt 2.3).

Zusammenarbeit über die Versionsverwaltung

Technisch wurde über ein gemeinsames Git-Repository auf GitHub zusammengearbeitet (siehe Abschnitt 2.3). Jedes Teammitglied committete überwiegend direkt auf den `main` Branch. Größere, zusammenhängende Änderungen legte sich jedes Mitglied bei Bedarf einen eigenen Arbeits-Branch an (`Dennis_Workbranch`, `Stefan_Workbranch`), der anschließend auf `main` zusammengeführt wurde. Ein formaler Review-Prozess über Pull Requests fand dabei nicht statt. Bei einem Team dieser Größe wurden Rückfragen zu Änderungen direkt in den wöchentlichen Besprechungen über Alfaview oder über WhatsApp geklärt (siehe erneut Abschnitt 2.3).

Die schriftlichen Dokumente (Lastenheft, Pflichtenheft, Softwaredokumentation, Testkonzept, dieser Endbericht, usw.) wurden nach zuvor festgelegtem Template gemeinsam in LaTeX verfasst. Änderungen an den Dokumenten wurden in der Tabelle der Versionshistorie festgehalten.


Schnittstellen zwischen den Gewerken

Die genannten Verantwortungsbereiche greifen im letztendlichen Hardwareaufbau eng ineinander. Um eine zeitgleiche Arbeit an den Kompontenten zu ermöglichen, wurde eine abstrahierende Schnittstelle zur losen Kopplung zwischen diesen eingeführt. Zentral dafür ist die Hardwareabstraktionsschicht `RobotHAL` (Abschnitt 1.4): Da die Navigations- und Sicherheitslogik gegen dieses Interface entwickelt wird, konnte die Algorithmik (Abschnitt 1.3) in der Simulation geprüft werden, während parallel die reale Hardwareanbindung aufgebaut wurde, ohne dass eine Seite auf den jeweils aktuellen Stand der anderen warten musste. Entkoppelt wurde die Mechanik (Abschnitt 1.2) über die Ansteuerung einzelner Servo-Freiheitsgrade angebunden. Eine engere Abstimmung war dort nötig, wo sich diese Schnittstellen im Projektverlauf änderten, etwa bei der nachträglichen Ergänzung der Radencoder (Abschnitt 1.8). Hierbei wurde die Erweiterung der `RobotHAL` zwischen Algorithmik und Elektronik abgestimmt, bevor sie umgesetzt wurde.

2.3 Kommunikation im Projekt (Gereon Such)


Kommunikation Gereon Such:

Das Coasterbot Team ist bei Stichprobengröße $N = 3$ in guter Näherung über ganz Deutschland verteilt und die Kommunikation fand folglich komplett digital statt. Die Teamleitung und Kommunikation in den Meilensteingesprächen wurde durch Dennis Borutta wahrgenommen. Die Aufgaben wurden in Arbeitspakete auf- und im Team verteilt. Ein wöchentliches Meeting wurde per Videokonferenz durchgeführt, in denen jedes Teammitglied Fortschritte mitgeteilt, auf eventuelle Probleme hingewiesen sowie um eventuelle Hilfe gebeten hat. Kurze Rückmeldungen dazwischen wurden in der Woche über eine WhatsApp-Gruppe geteilt. In der Kommunikation traten keine Probleme auf.



Projektverwaltung: Notion

Das Zentrale Projektsteuerungstool war **Notion**[1]. Dieses wurde zur Bestimmung von Verantwortlichkeiten, Unteraufgaben, Deadlines und Terminen genutzt, hauptsächlich gepflegt durch Dennis Borutta. Es ermöglicht neben einer wie der rechts dargestellten Timelinedarstellung auch ein kollaboratives Dokumentenmanagement, welches durch das Team insbesondere in der Anfangsphase des Projekts für Recherche und Brainstorming genutzt wurde.

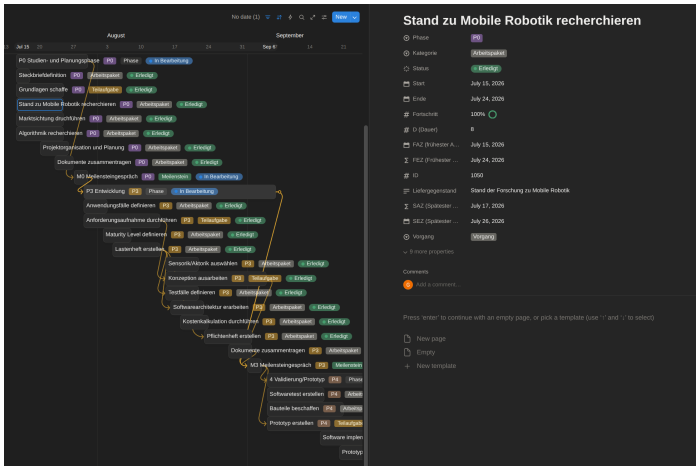

Kollaborationsplatform: Github

Das Projekt inklusive aller in LaTeX erstellten Dokumente, Sourcecode und anderer Entwicklungsdateien sind in einem Github[2] Projekt verfügbar[3]. Git[4] ist ein Versionsverwaltungssystem für das dezentrale Verwalten verschiedener Versionsstände und ist für das Coasterbot Projekt gewählt worden weil das Team bereits vertraut mit diesem Tool war, es kostenlos und Cross-Platform verfügbar ist. Github ist wiederum die zentrale Platform, an dem die Versionsstände wiederum gehostet werden.

Videokonferenz: Alfaview

Als Videokonferenzsystem für den wöchentlichen Austausch wurde auf eine Lösung der deutschen Firma Alfaview[5] aus Karlsruhe gesetzt. Es ermöglicht neben regulärer Videokonferenz sowohl das Teilen von Dateien als auch ein Screensharing, was für den Austausch der Arbeitsstände enorm vorteilhaft war.

Kommunikation: WhatsApp

Für schnelle informelle Abstimmung und Terminabsprachen wurde der Instant-Messanging WhatsApp[6] genutzt. Die Kommunikation erfolgte hier aufgrund der unterschiedlichen Berufsauslastung und familärer Situation im Team asynchron.

[1] https://www.notion.com
[2] https://github.com
[3] https://github.com/Project-CoasterBot/coasterbot
[4] https://git-scm.com
[5] https://alfaview.com
[6] https://whatsapp.com

2.4 Bewertung der Zusammenarbeit

Restrospektive Gereon Such:

Restrospektive Stefan Etringer:

Die Zusammenarbeit im Projekt bewerte ich als sehr gut. Die Kommunikation im Team war stets offen, zeitnah und konstruktiv. Resultierend daraus gab keine Blocker oder Verzögerungen auf Seiten der Struktur des Projekts. Die Rollenverteilung wurde aus meiner Sicht sinnvoll und nach Schwerpunkt der Expertise der Teammitglieder aufgeteilt. So konnten alle Beteiligten ihr Stärken ausspielen.

Ich selbst konnte meine Erfahrung aus der Automation und dem Management im Software-Testing einbringen. Insbesondere im Aufbau der Dokumente Lastenheft, Pflichtenheft und Testkonzept. Allerdings habe ich dadurch auch den Scope des Projekts als zu weit erachtet und die Dokumente zu detailliert aufgebaut, womit diese für die kurze Projektzeit wahrscheinlich zu lang wurden.

Über die Zusammenarbeit im Projekt mit meinen Teammitgliedern Gereon Such und Dennis Borutta kann ich nur sehr Gutes berichten. Beide habe ich stets als proaktive, gewissenhafte, ideenreiche und wertvolle Mitglieder des Teams erlebt, welche immer die Initiative ergreifen konnten. Sie genießen mein vollstes Vertrauen. Eine erneute Zusammenarbeit in weiteren Projekten würde ich sehr begrüßen.

Restrospektive Dennis Borutta:

Die Zusammenarbeit im Projektteam war stets konstruktiv und zielführend. Unterschiedliche Meinungen konnten sachlich diskutiert und gemeinsame Lösungen gefunden werden. Der regelmäßige Austausch in Online-Konferenzen war stets unkompliziert und zuverlässig. Das zeigt sich unter anderem daran, dass geplante Treffen nie verschoben werden mussten und am Ende jeder Konferenz der nächste Termin vereinbart wurde. Auch auf zwischenmenschlicher Ebene ließ sich gut zusammenarbeiten, da die Konferenzen auf mich stets locker und natürlich wirkten.

Gereon Such brachte seine Erfahrung in der Signalverarbeitung und im Entwurf von Leiterplattenlayouts gewinnbringend ein, da ohne sie einige Arbeiten deutlich länger gedauert hätten. Er übernahm die Auswahl und Integration der Sensoren und Treibermodule sowie die Erstellung des Schaltplans. Darüber hinaus setzte er sich früh mit dem Einsatz von KI zur Aufbereitung von Arbeitsergebnissen in unterschiedlichen Darstellungsformen auseinander. Damit half er dem Projektteam, zeitintensive Routinearbeiten schneller zu erledigen.

Stefan Etringer leistete gründliche Recherchearbeit zu den verwendeten Algorithmen, zur eingesetzten Software und zur einschlägigen Literatur. Dies unterstützte insbesondere die Einrichtung der Simulation, die Entwicklung der Software für die Navigations- und

Hinderniserkennung sowie die Strukturierung standardisierter Dokumente wie des Lastenhefts. Zudem halfen seine beruflichen Erfahrungen als Softwaretester dabei, relevante Testfälle zu definieren und zu strukturieren.

Insgesamt bin ich mit der Zusammenarbeit im Projektteam sehr zufrieden und kann mir eine erneute Zusammenarbeit in künftigen Projekten gut vorstellen.

2.5 Bewertung des Projektergebnis

Perspektive Gereon Such:

Die Bewertung des Ergebnisses möchte ich gerne differenzieren. So bin ich mit meiner persönlichen Lernkurve sowie dem Team vollumfänglich zufrieden. Ich habe einigermaßen Erfahrung im Embedded-Bereich, sowohl auf Hard- als auch Softwareebene, aber mit Aktorik und Energiemanagement habe ich wenig Erfahrung. Hier habe ich wiederum viel dazugelernt, muss aber eingestehen, dass ich mit meinem persönlichen Projektbeitrag nicht gänzlich zufrieden bin.

Da ich die Verantwortung für Konzeption und Entwicklung der Elektronik sowie das Abstrahieren dieser Funktionalitäten auf der Microcontrollerplattform übernommen habe sehe ich mich auch verantwortlich für Probleme der finalen Plattform, die daraus resultieren. Die meisten der getroffenen Entscheidungen und deren Umsetzung haben sich bewährt, aber insbesondere mit der Bewegungssteuerung und damit verbundener Navigation bin ich nicht zufrieden.

- DC-Motoren ziehen insbesondere beim Anfahren als auch bei stall(blockieren) erhebliche Ströme, eine Energiereglung (Linearregler, Buck Converter etc.), die diese Ströme liefern kann, ist teuer. Daher habe ich die Energieversorgung mit Zwei Pegeln konzipiert: Einer Motorspannung direkt am Akku der hohe Ströme liefern kann sowie einem VCC Pegel von 5V für die elektronischen Komponenten, die durch einen Regler bereitgestellt wird. Die Motoren haben einen Spannungsbereich von 3 bis 6 V, der gewählte Akku hat 3.7V, ist also näher am unteren Ende des Eingangsspannungsbereichs, möglicherweise wären 4 AA Batterien eine bessere Entscheidung gewesen.
- Das notwendige Anfahrdrehmoment auf den Rädern ist bei einer Drehung auf der Stelle erheblich höher als bei Geradeausfahrt. Vor der eigentlichen Festlegung auf die Komponenten habe ich die TT Motoren auf einem sehr leichten Rahmen getestet, hier waren die Motoren für Drehungen auf der Stelle völlig unproblematisch. Die Coasterbot Plattform ist durch die Dimensionierung und den Coastermechanismus allerdings bedeutend schwerer und hier ist das mögliche Drehmoment der Motoren grenzwertig. Bei Drehbewegungen auf der Stelle gibt es erheblichen Schlupf zwischen Antriebsrad und der Tischplatte, wodurch auch eine Orientierung per Odometrie nicht mehr möglich ist. Zum Zeitpunkt der Komponentenauswahl war zwar das Gewicht der Plattform nicht bekannt, dennoch würden stärkere Motoren

sicherlich weniger Probleme verursachen. Ebenso wäre eine Designentscheidung mit Kurvenfahrt statt Drehung auf der Stelle hier möglicherweise eine Lösung, dies wurde aber durch die Designentscheidung von kombinierter Ansteuerung von linker und rechter Seite verhindert.

- Durch die innenseitige Montage der Motoren und Achsführung nach Außen sitzt das Rad nur teilweise auf der Achse, da es sonst am Gehäuse schleift und ist dadurch tendenziell instabil.
- Das ursprünglich gewählte Inertialsystem durch Integration auf dem Gyroskop Sensor MPU-6050 war in der Praxis nicht praktikabel und ich musste eine Odometrie Zählung an den Achsen ergänzen. Hier gibt es DC-Motoren, die solche Zähler bereits eingebaut haben.

Von diesen Problemen abgesehen ist das Gesamtprojekt als Proof-of-Concept einer Robotikplatform aus meiner Bewertung dennoch ein Erfolg und ich bin sehr froh, dass ich mich beteiligen und mit Dennis Borutta und Stefan Etringer zusammenarbeiten durfte.

Eine mögliche Lösung für das Positionssystem wäre auf dieses komplett zu verzichten und stattdessen eine optische Erkennung der Umgebung mit der ohnehin geplanten Kamera zu implementieren. Ein solches System kann Ziele und Geometrie der überschaubaren Oberfläche eines Tisches vermutlich hinreichend erfassen statt auf ein blindes Positionierungssystem angewiesen zu sein. Dies wäre eine mögliche Aufgabe für ein zukünftiges Projekt.

Perspektive Stefan Etringer:

Die Projektdauer bedingte die Einteilung des Aufbaus in Maturity Level. Level 1 stellt den Prototypen dar, der innerhalb der Projektzeit realisiert wurde. Dieser Level wurde nahezu vollständig wie geplant abgedeckt von unserem Prototyp. Dies bedeutet, dass die Projektplanung von uns realistisch durchgeführt und festgehalten wurde.

Eine der Änderungen, die am Prototyp vorgenommen werden sollten, betreffen die Nutzung der Aktoren und Sensoren für die Fortbewegung und Orientierung des Roboters. Manche Punkte haben sich nach den Tests als ausreichend bis mangelhaft für eine akkurate Bewegung über den Tisch erwiesen.

Andererseits heißt dies, dass wir bereits in der Prototypenphase erfolgreich Unzulänglichkeiten im Design erkennen konnten, die in den folgenden Maturity Leveln korrigiert werden können.

Deshalb halte ich die Prototypenphase und somit auch das Projekt im gesamten als erfolgreich abgeschlossen.

Perspektive Dennis Borutta:

In Anbetracht der kurzen Projektdauer ist dennoch ein funktionsfähiger Prototyp entstanden. Dass dieser noch nicht alle Funktionen vollumfänglich und zur vollsten Zufriedenheit erfüllen wird, war für mich zu erwarten. Insbesondere bin ich mit meiner Lernkurve

innerhalb des Projektes zufrieden. Obwohl ich bisher keine Berührungspunkte im Bereich der mobilen Robotik gehabt habe, wurde es dennoch zusammen mit dem Projektteam erreicht, einen selbstständig navigierenden mobilen Roboter von Grund auf zu entwickeln, der Getränkeuntersetzer spenden kann.

In zukünftigen Projekten würde ich jedoch noch mehr die Schnittstellen zwischen Gewerken in den Blick nehmen und diese frühzeitiger definieren. Das hätte vermutlich einen kompakteren Prototyp ermöglicht und die Übertragung der Software von der Simulation auf die Hardware erleichtert.

Mein Schwerpunkt innerhalb der Umsetzung des Projektes lag in der Gestaltung der mechanischen Komponenten. Hierbei würde ich in Zukunft die Kontaktpunkte mit dem Boden besser fixieren. Die austauschbaren Seitenwände haben die Montage der Sensoren erleichtert, bei den Motoren jedoch dazu geführt, dass die Bodenplatte nach unten rutscht, sobald der Deckel des Gehäuses abgenommen wird. Weiterhin würde ich mir mehr Zeit für Tests der Ausgabemechanik einräumen, da erst zum Projektende auffiel, dass die vorgesehenen Führungen ein Verkanten der Ausgabemechaniken begünstigen und der Ausschieber zu schmal geraten ist.

Da trotz allem ein funktionsfähiger Prototyp entstanden ist, bewerte ich diese Erkenntnisse als lehrreiche, aber nicht erfolgsentscheidend für das Projekt. Daher ist für mich das Projektergebnis insgesamt zufriedenstellend.
